



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA

1° SERVIZIO - PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE DI CUI AL D.M. N.49 DEL 16/02/2018

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA ZONA NORD DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

TAVOLA N.

P1.1

DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA

Progettisti e D.LL.:

Dott. Ing. Cosimo RIZZO

Geom. Fabrizio FASANO


Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Dott. Ing. Cosimo RIZZO

Ispettori di cantiere:

Geom. Francesco DI SALVATORE

Dott. Antonio GIULIANO

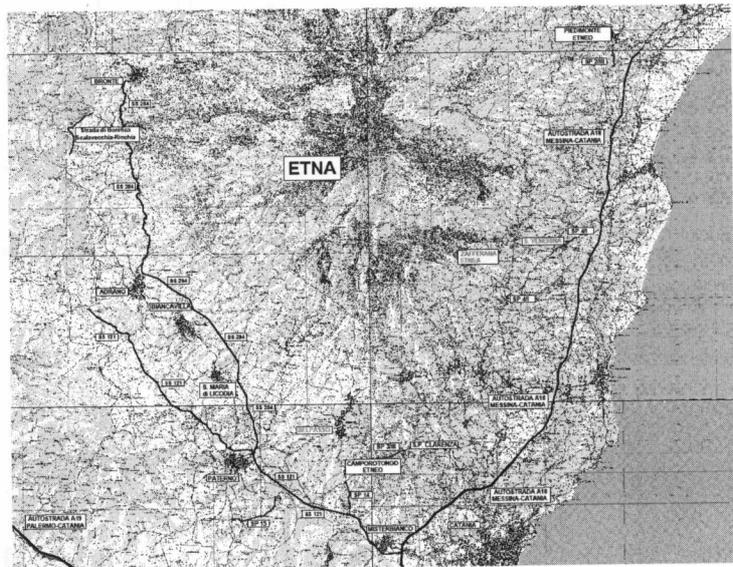

Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n.207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento n. del 29/06/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Alberto Buccheri

Data: 29/06/2018

Aggiornamento in data:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alberto BUCCHERI



L'INGEGNERE CAPO DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Giuseppe Galizia



DIAGRAMMA DI GANTT

					DURATA CONTRATTUALE		
					1° MESE	2° MESE	3° MESE
	IMPORTO	INIZIO	FINE	DURATA PRESUNTA			
OPERE PROVVISORIE E DI SICUREZZA	11.352,58	1° MESE	3° MESE				
Segnaletica temporanea di cantiere	11.352,58	1° MESE	3° MESE	7 gg			
PAVIMENTAZIONE STRADALE	638.585,59	1° MESE	3° MESE				
Scarificazione e trasporto a rifiuto	219.634,46	1° MESE	3° MESE	15 gg			
Conglomerato bituminoso	393.135,77	1° MESE	3° MESE	16 gg			
Prove in situ e di laboratorio	14.697,18	2° MESE	3° MESE	3 gg			
Lavori di concausa	11.118,18	1° MESE	2° MESE	3 gg			
SEGNALETICA STRADALE	56.488,11	2° MESE	3° MESE				
Segnaletica orizzontale	47.387,75	2° MESE	3° MESE	6 gg			
Segnaletica verticale	9.100,36	2° MESE	3° MESE	3 gg			
BARRIERA DI SICUREZZA	13.290,81	1° MESE	2° MESE				
Barriera	13.290,81	1° MESE	2° MESE	2 gg			
PARZIALI					187.001,09	223.331,76	309.384,24
PROGRESSIVI					187.001,09	410.332,85	719.717,09
	Opere provv. e di sicurezza - Lavori stradali						
	Segnaletica stradale						
	Barriera stradale di sicurezza						

CRONOPROGRAMMA (art. 40 D.P.R. 207/2010)

